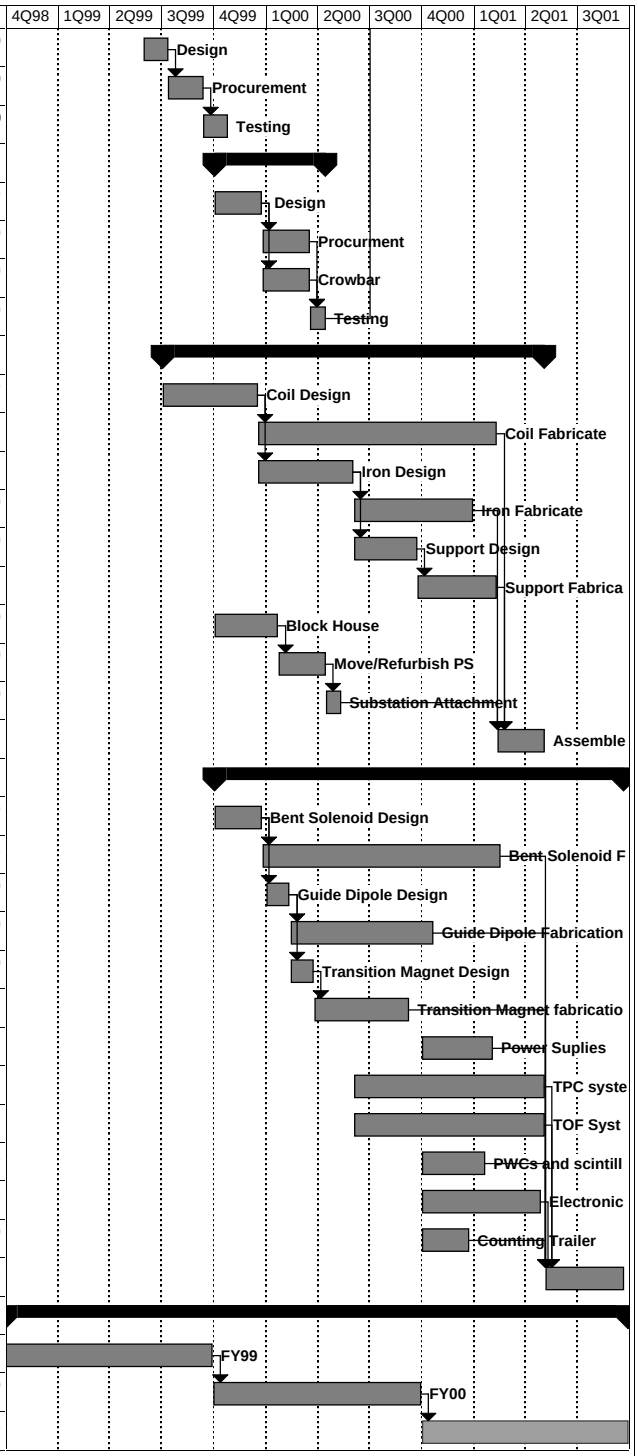ID	Task Name	Duration	Cost	Start	Finish
50	Design	30 days	$10,000	Tue 6/1/99	Mon 7/12/99
51	Procurement	45 days	$20,000	Tue 7/13/99	Mon 9/13/99
52	Testing	30 days	$10,000	Tue 9/14/99	Mon 10/25/99
53	**Pulsing System**	**140 days**	**$110,000**	**Mon 10/4/99**	**Fri 4/14/00**
54	Design	60 days	$30,000	Mon 10/4/99	Fri 12/24/99
55	Procurment	60 days	$30,000	Mon 12/27/99	Fri 3/17/00
56	Crowbar	60 days	$30,000	Mon 12/27/99	Fri 3/17/00
57	Testing	20 days	$20,000	Mon 3/20/00	Fri 4/14/00
58	**RF Solenoid**	**480 days**	**$1,100,000**	**Mon 7/5/99**	**Fri 5/4/01**
59	Coil Design	120 days	$60,000	Mon 7/5/99	Fri 12/17/99
60	Coil Fabricate	300 days	$500,000	Mon 12/20/99	Fri 2/9/01
61	Iron Design	120 days	$60,000	Mon 12/20/99	Fri 6/2/00
62	Iron Fabricate	150 days	$200,000	Mon 6/5/00	Fri 12/29/00
63	Support Design	80 days	$40,000	Mon 6/5/00	Fri 9/22/00
64	Support Fabricate	100 days	$50,000	Mon 9/25/00	Fri 2/9/01
65	Block House	80 days	$20,000	Mon 10/4/99	Fri 1/21/00
66	Move/Refurbish PS	60 days	$30,000	Mon 1/24/00	Fri 4/14/00
67	Substation Attachment	20 days	$20,000	Mon 4/17/00	Fri 5/12/00
68	Assemble/Test	60 days	$120,000	Mon 2/12/01	Fri 5/4/01
69	**Capture Experiment**	**515 days**	**$1,750,000**	**Mon 10/4/99**	**Fri 9/21/01**
70	Bent Solenoid Design	60 days	$30,000	Mon 10/4/99	Fri 12/24/99
71	Bent Solenoid Fabricati	300 days	$500,000	Mon 12/27/99	Fri 2/16/01
72	Guide Dipole Design	30 days	$20,000	Mon 1/3/00	Fri 2/11/00
73	Guide Dipole Fabricatio	180 days	$150,000	Mon 2/14/00	Fri 10/20/00
74	Transition Magnet Desi	30 days	$20,000	Mon 2/14/00	Fri 3/24/00
75	Transition Magnet fabri	120 days	$100,000	Mon 3/27/00	Fri 9/8/00
76	Power Suplies	90 days	$100,000	Mon 10/2/00	Fri 2/2/01
77	TPC system	240 days	$240,000	Mon 6/5/00	Fri 5/4/01
78	TOF System	240 days	$120,000	Mon 6/5/00	Fri 5/4/01
79	PWCs and scintillators	80 days	$150,000	Mon 10/2/00	Fri 1/19/01
80	Electronics and DAQDa	150 days	$200,000	Mon 10/2/00	Fri 4/27/01
81	Counting Trailer	60 days	$60,000	Mon 10/2/00	Fri 12/22/00
82	Assemble/Test	100 days	$60,000	Mon 5/7/01	Fri 9/21/01
83	**Simulation**	**782 days**	**$450,000**	**Thu 10/1/98**	**Fri 9/28/01**
84	FY99	260 days	$150,000	Thu 10/1/98	Wed 9/29/99
85	FY00	261 days	$150,000	Fri 10/1/99	Fri 9/29/00
86	FY01	260 days	$150,000	Mon 10/2/00	Fri 9/28/01
